Schouwverslag

Datum: 22 januari
Project: PIMS Tydecampstraat
Locatie: Dalfsen

Aanwezig:

Naam	Bedrijf	Email
5.1.2e	Hanab Distribution	5.1.2e @hanab.nl
Job Kervezee	Hanab Distribution	5.1.2e @hanab.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Hanab Distribution	5.1.2e @tsned.nl

Civiel de Hooislagen



Hooislagen (Trace vanaf einde BAM)

- Werkzaamheden worden uitgevoerd in de berm; verwachting is dat er voldoende ruimte is voor zandopslag.
- Halve rijbaanafzetting met rijplaten naast de weg.
- Uitgangspunt: 60 cm uit de kant met schuine kanten, tenzij dit lokaal niet mogelijk is.


Mantelbuizen Hooislagen

- **Hooislagen 4:** aanbrengen van mantelbuizen.
- **Hooislagen 2:** aanbrengen van mantelbuizen.
- Voor mantelbuizen geldt: per locatie één dag niet toegankelijk.

GB01 Kruising Hooislagenweg – Hoevendwarsweg

- Bij intrede/uittrede punten geen bijzonderheden; zelfde werkwijze hanteren als bij reguliere graafwerkzaamheden.
- Tijdens de werkzaamheden wordt de Hoevendwarsweg volledig afgesloten met uitzondering van aanwonende.

Civiel Hoevendwarsweg

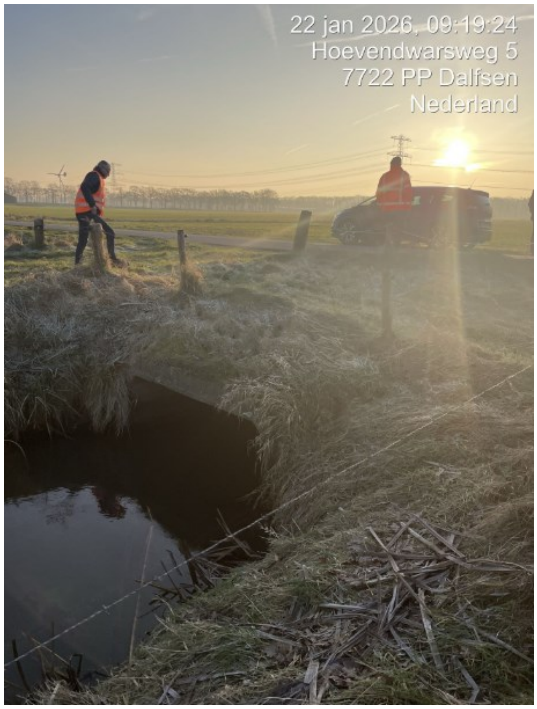

- Duiker ligt op de plek om de gewenste diepte te halen.

Actie Hanab: beoordelen en oplossing bepalen.

- Boring toepassen in plaats van persing ter hoogte van de inrit Hoevendwarsweg 5.
  - Na de zijweg de boring laten uittreden aan de linkerzijde.

Actie Hanab: toetsen of dit technisch haalbaar is in verband met de boorlijn.

- Weg blijft volledig afgesloten (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Gaat gefaseerd meebewegend met de werkzaamheden.

- **Hoevendwarsweg 1 en 1a:** één mantelbuis en eén staalpersing onder de inrit van het weiland.

GB03 Nieuwe Kreuleweg – Hoevendwarsweg



Wens gemeente:

- Bij boring 3 onderzoeken of de boorlijn na de Nieuwe Kreukenweg kan oversteken naar de overzijde van de weg.

Actie Hanab: technisch beoordelen in relatie tot de boorlijn.

- Geen belemmeringen door bomen langs de Hoevendwarsweg.

- Na afronding van de werkzaamheden borden plaatsen: *'zachte berm'*.

Civiel Hoevedwarsweg vanaf Nieuwe Kreuleweg





Wens gemeente:

- Twee staalpersingen ter hoogte van de bomen.
- Na open ontgraving haaks onder de weg door persen naar de overzijde.
- Vervolgens een boring inzetten met uittrede ter hoogte van de Dedemsvaartweg (bij verkeersbord).

Actie Hanab: onderzoeken of deze werkwijze technisch haalbaar is.


Civiel Dedemsweg



- Fietspad Dedemsvaartweg minimaal half afsluiten.

Actie Hanab: in overleg met TSned onderzoeken of volledige afsluiting mogelijk is i.v.m. veiligheid.

- Indien volledige afsluiting niet mogelijk is, optie de sloot tijdelijk vullen met zand.

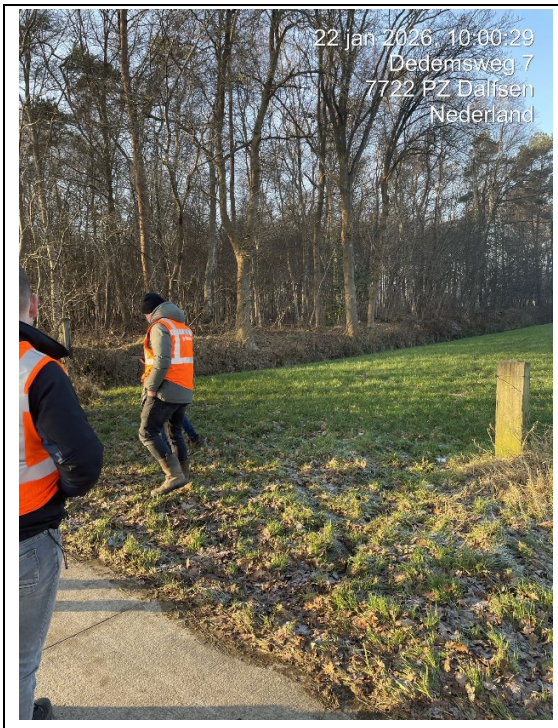

- Onderzoeken of het boorgat mogelijk is i.v.m. aanwezige combi-kabels.

Actie Hanab: vaststellen wie grondeigenaar is voor het opstellen van boormachine en materieel.

- Bij geen medewerking: alternatief via fietspad, met extra attentie voor fietsers of fietspad afsluiten.

- **Dedemsweg 5:** staalpersing onder de inrit.

GB06 Dedemsweg



Actie Hanab: bepalen wie grondeigenaar is voor opstelruimte boormachine en materieel.

- Bij geen medewerking: alternatief via fietspad met extra veiligheidsmaatregelen of fietspad afsluiten.

Na gestuurde boring 6

Onderzoeken of tracé in de tussenberm kan worden aangelegd of aan de zijde van de paardenbak.

- Eerste boring na de provinciale weg:

Actie Hanab: nagaan waarom hier geboord wordt en of civiele uitvoering mogelijk is, of dat ondergrondse infra dit vereist.

Hanab



- Onzekerheid over noodzaak van de boring; mogelijk gerelateerd aan de 240-kabel.

Actie Hanab: verduidelijken reden van deze boring.



Boring Koesteeg – Wilhelminastraat – gemeentekavel:

Twee staalpersingen onder het fietspad bij de rotonde.

Actie Gemeente: bestemming en achtergrond van de kavel uitzoeken.

Actie Hanab: nagaan of hierover al contact is geweest.

- Indien niet haalbaar: boringen 8 en 9 aanpassen.

Wilhelminastraat / Brethouwerstraat



Ter hoogte van Wilhelminastraat 8:

- Kruising met Brethouwerstraat afsluiten.

Actie Hanab: onderzoeken of TSned het mogelijk kan maken om de doorvoer van de Wilhelminastraat open te houden.

- Extra aandacht voor de bereikbaarheid van beide scholen.
- Indien planningstechnisch mogelijk, werkzaamheden uitvoeren tijdens schoolvakanties.

Actie Hanab: Controleren of de parkeerplaats gemeentelijke grond is (uittredepunt boring).

- Parkeerplaats afzetten met bouwhekken en tijdelijk afsluiten.

Boring 11 – Van Tydencampstraat



- Vierkant afzetten rond intrede- en uittredepunt van de boring.

Actie Hanab: bepalen of uittrede plaatsvindt in struiken, rijbaan of trottoir.

- Laatste deel van de Brethouwerstraat afsluiten voor voetgangers.
- Zebrapad blijft bereikbaar.
- Voetgangers worden omgeleid en moeten oversteken.

Algemeen

- Communicatie is essentieel.
    - Omwonenden tijdig informeren via bewonersbrief.
- Tijdens uitvoering nauw contact onderhouden met omgeving.
    - Specifiek aandacht voor afstemming van transportbewegingen met agrariërs.
- Nulmeting uitvoeren enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden, inclusief fotoregistratie.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1
